

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas



# Projektplan Öppna Data

VERSION 0.9 EXKL. BILAGOR

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas



## Innehåll

<b>1 Inledning och bakgrund</b> .....	3
1.1 Bakgrund – Projektbeskrivning .....	3
1.2 Syfte .....	3
1.3 Versionshistorik .....	4
<b>2 Mål</b> .....	4
2.1 Resultatmål .....	4
2.2 Effektmål .....	5
2.3 Omfattning .....	6
2.4 Avgränsningar .....	7
<b>3 Strategi och metod</b> .....	7
3.1 Strategi .....	7
3.2 Projektmodell .....	8
3.3 Målstyrningsfokus .....	8
3.4 Tillvägagångssätt .....	8
3.5 Aktivitetsplan – delprojekt öppna data .....	9
3.6 Tidplan .....	9
3.7 Ändringshantering .....	10
3.8 Dokumenthantering .....	10
3.9 Miljö .....	10
<b>4 Ekonomi/Resurser</b> .....	11
4.1 Ekonomi/Projektbudget .....	11
4.2 Projektorganisation .....	12
4.3 Bemanning och resurshantering öppna data .....	13
<b>5 Bilagor</b> .....	14
5.1 Bilaga 1 – Aktivitets- och Tidplan .....	14
5.2 Bilaga 2 – Riskanalys .....	14
5.3 Bilaga 3 - Kommunikationsstrategi .....	14

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

## 1 Inledning och bakgrund

Projekt S2i2 styrs ytterst av det beslut om stöd som Tillväxtverket<sup>1</sup> fattat i maj 2021. Denna projektplan har sammanställts utifrån detta beslut för att fungera som projektbeskrivning för det ena av två delprojekt inom ramen för S2i2-projektet – delprojekt Öppna Data. För det andra delprojektet – SDK – har motsvarande projektplan tagits fram. Tilldelningsbeslutet från Tillväxtverket är överordnad denna projektplan. Förändringar i beslutet från Tillväxtverket blir därmed styrande för projektet, även om ingen (följd)ändring gjorts i denna projektplan.

### 1.1 BAKGRUND – PROJEKTBEKRIVNING

En korrekt hantering av information i offentlig sektor är avgörande för att bibehålla invånarnas förtroende och för ett effektivt och säkert informationsutbyte. Höga krav ställs på kompetens inom informationshantering.

Offentlig information är en värdefull resurs om den görs tillgänglig för återanvändning. Publicering av öppna data ger exempelvis möjligheter till ökad insyn i offentlig verksamhet, effektivisering av processer och ökad innovation i näringslivet.

Region Skåne har tillsammans med tio samverkansparter tilldelats finansiering från Europeiska Regionalfonden för att genomföra projektet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (nedan kallat S2i2).

Projektet riktar sig till skånska kommuner, Region Skåne och näringslivet i Skåne. Projektet leds av en gemensam styrgrupp och arbetet drivs i två delprojekt, Öppna Data och SDK, med varsin processledare och olika deltagare i respektive delprojekt.

#### Delprojekt Öppna Data

Delprojektet Öppna data syftar till att via en regional samverkan öka offentliga aktörers kunskap om och publicering av öppna data samt att öka näringslivets kunskap om och användning av offentliga öppna data.

Delprojektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och att näringslivet har stärkt sin innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna data.

### 1.2 SYFTE

Projektet syftar till ett säkrare informationsutbyte och en ökad tillgång och användning av öppna data genom en stark regional samverkan.

---

<sup>1</sup> Beslut om stöd från Tillväxtverket till projektet ”Skånsk Samverkan för Innovativ informationshantering - S2I2”, ärendeid 20303832, beslutsdatum 2021-04-29

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

Projektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och att näringslivet har stärkt sin innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna data.

När projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och näringslivets möjligheter att använda öppna data ska ha ökat.

### 1.3 VERSIONSHISTORIK

Dokumentversioner			
Datum	Version	Ändrat av	Kommentar
2021-09-15	0.1	Jakob Kulas	Första utkastet
2021-10-05	0.2	Jakob Kulas	Lagt över innehåll i ny mall
2021-10-09	0.3	Jakob Kulas	Koordinering projektplan SDK
2021-10-10	0.4	Jakob Kulas	Komplettering aktiviteter
2021-10-10	0.5	Jakob Kulas	Komplettering projektekonomi
2021-10-11	0.6	Jakob Kulas	Version på remiss till deltagare
2021-10-11	0.9	Jakob Kulas	Samordning med SDK
	1.0		Projektplan fastställd

## 2 Mål

Projektets målsättningar är beskrivna i beslutet om stöd från Tillväxtverket och har delvis återgivits nedan.

### S2i2-projektets övergripande mål

- Projektet kommer på lång sikt bidra till att offentliga aktörer har en god informationshantering som ger tillgång till rätt information, i rätt tid och på rätt plats och att näringslivet har stärkt sin innovationsförmåga tack vare ökad användning av öppna data.

### Projektmål – delprojekt Öppna Data

- När projektet avslutas ska deltagande kommuner och Region Skåne ha ökat sin förmåga att publicera öppna data och näringslivets möjligheter att använda öppna data ska ha ökat.

### 2.1 RESULTATMÅL

Förväntat resultat S2i2 – delprojekt Öppna Data vid projektavslut 2023:

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

- 33 skånska kommuner kommer att ha medverkat i utbildningar för användning av öppna data och höjt sin kunskap om dess värde för den interna kommunala förvaltningen såväl som dess användning i privat sektor i Skåne.
- 33 kommuner har tillgång till en testmiljö för öppna data.
- 33 kommuner har påbörjat analyser kring öppna data samt identifierat 5 möjliga dataströmmar.
- 5 kommuner kommer att ha minskat sin administrationskostnad genom att publicera öppna data. Mäts genom en nollmätning av dagens process innan arbetet påbörjas, tex antal timmar som läggs på att hantera förfrågningar om fakturor. Utvärdering görs i slutet av projektet men den största nyttan kommer att uppstå när processen har löpt över längre tid.
- 10 företag har aktivt tagit del i projektet för att skapa förutsättningar för samverkan med kommunala aktörer och för att redogöra för sina behov av öppna data.
- 5 kommuner kommer att ha påbörjat ett samarbete med näringslivet gällande extern användning av öppna data baserat på företagets behov och önskemål.

Samtliga dessa resultatmål ska vara uppfyllda vid projektets slut i mars 2023.

## 2.2 EFFEKTMÅL

Projektets delmål enligt beslut om stöd från Tillväxtverket beskrivs nedan.

**Delmål 1:** Offentliga aktörer och näringsliv ska ha en ökad kompetens kring öppna data och informationshantering som är relevant för respektive nivå (ledning, IT, verksamhet)

**Delmål 2:** Informationsmängder som lämpar sig som öppna data ska vara kartlagda.

**Delmål 3:** Samtliga kommuner och Region Skåne ska ha tillgång till en testmiljö i en öppna data-plattform.

**Delmål 4:** Beslutsunderlag för en regional struktur för samverkan inom öppna data ska tas fram.

**Delmål 5:** Medverkande kommuner\* ska ha ett utökat samarbete med näringslivet för en ökad kunskap om företagets behov gällande öppna data.

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

Målen kommer att mätas fortlöpande med utvärderingsfrågor som återkommer regelbundet efter olika aktiviteter. Syftet är att få en bild av lärandet och även att utveckla det fortsatta genomförandet i projektet. Eftersom deltagande kommuner kommer att engageras successivt har projektet möjlighet att anpassa och utveckla aktiviteter utifrån utvärderingsresultaten.

Enkäter genomförs för att belysa kunskapsnivå inom de olika målgrupperna. Inom öppna data används den genomförda enkäten i nulägesanalysen som nollmätning som sedan upprepas för att mäta projektets resultat.

Kvantitativa mätningar görs kring hur många av deltagande aktörer som har genomfört förberedelser, har anslutit till SDK respektive har tillgång till en öppna dataplattform.

\*Med medverkande kommuner avses de fem kommuner som är samverkanspartners i detta projekt; Malmö, Lund, Landskrona, Tomelilla och Kristianstad.

## **2.3 OMFATTNING**

Övergripande aktiviteter som beskriver omfattningen av delprojektet Öppna Data:

- A1. Framtagande av projektplan för uppdraget (2021 Q3-Q4)
- A2. Analys inför publicering av öppna data - dataströmmar, strukturering och externt samarbete med näringslivet (2021 Q3-Q4)
- A3. Publicering, skapande av handlingsplan och tillgängliggörande av öppna data (2021Q3 - 2022 Q4)
- A4. Omvärldsanalys utifrån regionala förutsättningar för öppna dataströmmar (2021 Q3 – 2022 Q4)
- A5. Behovsanalys och workshops utifrån ett näringslivsperspektiv (2021 Q3 - 2022 Q4)
- A6. Stöd och utbildning vid publicering av öppna data (2021 Q4 -2022 Q4)
- A7. Extern kommunikation och resultatspridning (löpande)
- A8. Utvärdering och lärande (löpande)
- A9. Avslutsarbete (2023 Q1)

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

## 2.4 AVGRÄNSNINGAR

Projektet har ett näringslivsperspektiv men kommer inte beakta forskningens och journalistikens behov.

## 3 Strategi och metod

### 3.1 STRATEGI

Projektet bidrar till Europa 2020-strategin på följande vis;

- Smart tillväxt – både genom publicering av Öppen Data (ÖD) samt integreringen av Säker Digital Kommunikation (SDK), så säkerställer projektet att Skåne befinner sig i framkant gällande att skapa förutsättningar för digital innovation genom regional samverkan och utveckling av en ekonomi baserad på kunskap och innovation.
- Hållbar tillväxt – SDK bidrar tydligt genom eliminering av föråldrade lösningar som faxen samt skapar en mer effektiv och säker kommunikation. Öppna data banar väg för datadrivna innovationer. Exempelvis optimering av rutter för sophantering vilket minskar mängden trafik och på så vis även utsläpp vilket långsiktigt kommer att främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.
- Tillväxt för alla – att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning: Genom projektets samarbete med industrin inom ÖD, så öppnar projektet upp för möjligheten att dessa utökar sin verksamhet och på så vis kan nyanställa samt resonera kring nya affärsmodeller som långsiktigt även skapar social och territoriell sammanhållning.

**Senast uppdaterad:** 21-10-11


**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

### 3.2 PROJEKTMODELL

#### Region Skånes projektmodell




Inom Region Skåne används projektmodellen BUM (Beställare, Utförare, Mottagare). BUM har målsättningen att stödja och förtydliga ansvarsfördelningen för de samarbetsaktiviteter som är nödvändiga för ett lyckat och effektivt projekt.

Modellen tar utgångspunkt i de förutsättningar som skall vara på plats när projektfaser påbörjas respektive avslutas. Modellen innefattar faser och beslutspunkter visade i bilden ovan.

### 3.3 MÅLSTYRNINGSFOKUS

Förslag till prioritering: Tid: 0,5, Kostnad: 0,25 och Kvalitet 0,25.

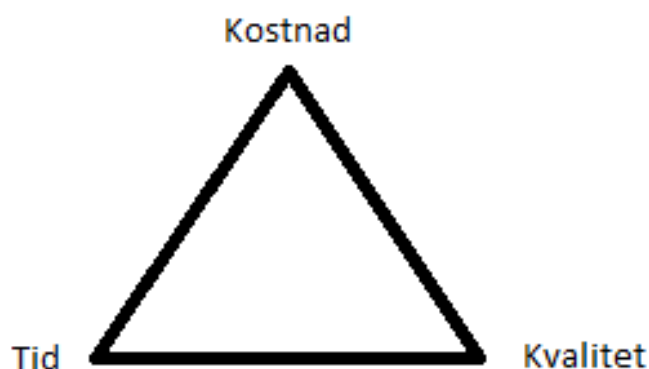

### 3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

S2i2-projektet kommer att ledas av en huvudprojektledare med stöd av två processledare som ansvarar för var sitt delprojekt; SDK och Öppna Data. Dessa driver i sin tur arbetet med samtliga delprojektledare via medverkande kommuner samt Media Evolution, IUC Syd och Skånes Kommuner. Kommunerna ansvarar för den praktiska implementeringen av sina interna aktiviteter och Media Evolution och IUC Syd står för aktiviteterna som har koppling till näringslivet.

Aktiviteter som ingår i projektledningen är:

- Genomförande av projektmöten.



**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

- Genomförande av styrgruppsmöten.
- Rapportering internt men även mot TVV.
- Uppföljning av resultat och aktiviteter
- Samordning av delprojekten.
- Löpande projektledning.
- Uppföljning av lärandeprocesser.
- Hantering av risker baserat på riskanalysen.
- Uppföljning av tidsschema.
- Säkerställande av hållbarhetsaspekter.
- Uppföljning av indikatorer.
- Uppföljning av budget.

Rapportering av projektets genomförande och resultat sker löpande:

- Vid styrgruppens möten
- Vid projektets löpande avrapporteringsmöten
- Enligt de krav som ställs från Tillväxtverket enligt beslut om medfinansiering

### **3.5 AKTIVITETSPLAN – DELPROJEKT ÖPPNA DATA**

Beslutet från Tillväxtverket inkluderar fem huvudaktiviteter:

A4:1 Analys inför publicering av öppna data – dataströmmar, strukturering och externt samarbete med näringslivet

A4:2 Publicering, skapande av handlingsplan och tillgängliggörande öppna av data

A4:3 Omvärldsanalys utifrån regionala förutsättningar för öppna dataströmmar

A4:4 Behovsanalyser och workshops utifrån ett näringslivsperspektiv

A4:5 Stöd och utbildning vid publicering av öppna data

En mer detaljerad aktivitets- och tidplan är bilagd projektplanen som bilaga 1. Denna kommer löpande att uppdateras under projektets genomförande.

### **3.6 TIDPLAN**


Projektets aktiviteter genomförs i huvudsak under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2022. Därefter sker slutrapportering. Projektets formella startdatum är den 1 juni 2021 och slutdatum är den 31 mars 2023.

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

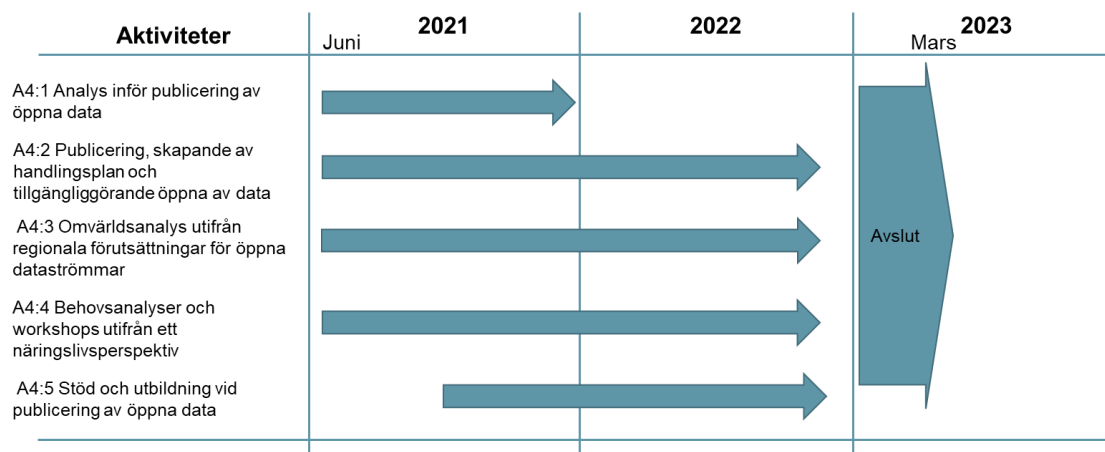

En mer detaljerad aktivitets- och tidplan är bilagd projektplanen som bilaga 1. Denna kommer löpande att uppdateras under projektets genomförande.

### 3.7 ÄNDRINGSHANTERING

Förändringar i projektets omfattning såsom förändringar i krav, budget, tidplan, leveranser med mera ska ändringshanteras och dokumenteras.

Dessa aktiviteter leds av projektledaren. Grundregeln är att styrgrupp beslutar i dessa fall.

### 3.8 DOKUMENTHANTERING

- Dokument versionshanteras, arbetsdokument har version 0.1, 0.2 osv. medan "färdiga" dokument har version nr 1.0, 2.0 osv.
- OBS! Vid framtagande av obligatoriska dokument enligt Region Skånes projektmodell ska fastställda mallar användas.
- Inga rubriker får tas bort ur dokumentmallar. Då rubrik inte är applicerbar noteras "Ej tillämpligt" under rubriken.
- Dokument skall lagras enligt aktuell rutinbeskrivning.
- Obligatoriska projektdokument ska diarieföras och arkiveras enligt för regionen gällande regler

### 3.9 MILJÖ

Miljö- och hållbarhetsaspekter som finns i Tillväxtverkets beslut kommer behandlas löpande i projektet.

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

## 4 Ekonomi/Resurser

### 4.1 EKONOMI/PROJEKTBUDET

Aktivitet	Kostnad
<b>A4 Öppna Data - Analys, publicering och omvärldsanalys</b>	<b>2 945 000 kr</b>
A4.1 Analys inför publicering av öppna data – dataströmmar, strukturering och externt samarbete med näringslivet	600 000 kr
A4.2 Publicering, skapande av handlingsplan och tillgängliggörande av öppna data	1 170 000 kr
A4.3 Omvärldsanalys utifrån regionala förutsättningar för öppna dataströmmar	400 000 kr
A4.4 Behovsanalyser och workshops utifrån ett näringslivsperspektiv	425 000 kr
A4.5 Stöd och utbildning vid publicering av öppna data	350 000 kr

Medfinansiering för S2i2-projektets delprojekt Öppna Data fördelar sig enligt följande:

Offentlig kontantfinansiering	2021	2022	2023	Totalt
Tomelilla kommun	45 000 kr	90 000 kr	0	135 000 kr
Landskrona kommun	45 000 kr	90 000 kr	0	135 000 kr
Malmö kommun	22 500 kr	45 000 kr	0	67 500 kr

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

Kristianstads kommun	45 000 kr	90 000 kr	0	135 000 kr
Lunds kommun	45 000 kr	90 000 kr	0	135 000 kr

Eventuella lokala kostnader <sup>2</sup> som uppstår hos en enskild kommun, kommunalt bolag eller regional förvaltning som en följd av projektets genomförande, finansieras inte med projektets tilldelade medel. Dessa kostnader finansieras istället av den berörda lokala verksamheten.

#### 4.2 PROJEKTORGANISATION

Delprojektets huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och följa upp arbetet med S2i2:s delprojekt Öppna Data. För att kunna genomföra detta uppdrag behöver arbetsgruppen bestå av eller kompletteras med personer med expertis inom nedan beskrivna kompetensområden:

1. **Processledning** – planering, koordinering och uppföljning
2. **Samordning** av de skånska kommunernas planering, förankring och genomförande
3. **Kommunikation** – framtagande och genomförande av kommunikationsplan
4. **Juridik, IT-säkerhet och informationssäkerhet** – Expertfunktioner kommer att behöva involveras för att ta fram ett adekvat stöd för kommunalt införande av Öppna Data.
5. **Analys** – förberedelser inför och utförande av analyser, inklusive nulägesbeskrivningar och omvärldsanalys
6. **Utbildning** – framtagande av utbildningsmaterial och genomförande av utbildning/kompetenshöjande aktiviteter för olika målgrupper
7. **Rapportering** – intern och extern rapportering

Rollfördelningen mellan aktörerna i projektet beskrivs översiktligt nedan: arbetet med S2i2:s delprojekt Öppna Data bistår Region Skåne med processledning och Skånes Kommuner med samordning och kommunikationsinsatser. Deltagande kommuner är Tomelilla kommun, Landskrona stad, Malmö stad, Lunds kommun och Kristianstads kommun. Delprojekt Öppna Data styrs och följs upp av S2i2-projektets gemensamma styrgrupp som representerar samtliga deltagande organisationer.


<sup>2</sup> Exempelvis personella resurser, konsulter eller anpassningar i den lokala tekniska miljön,

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

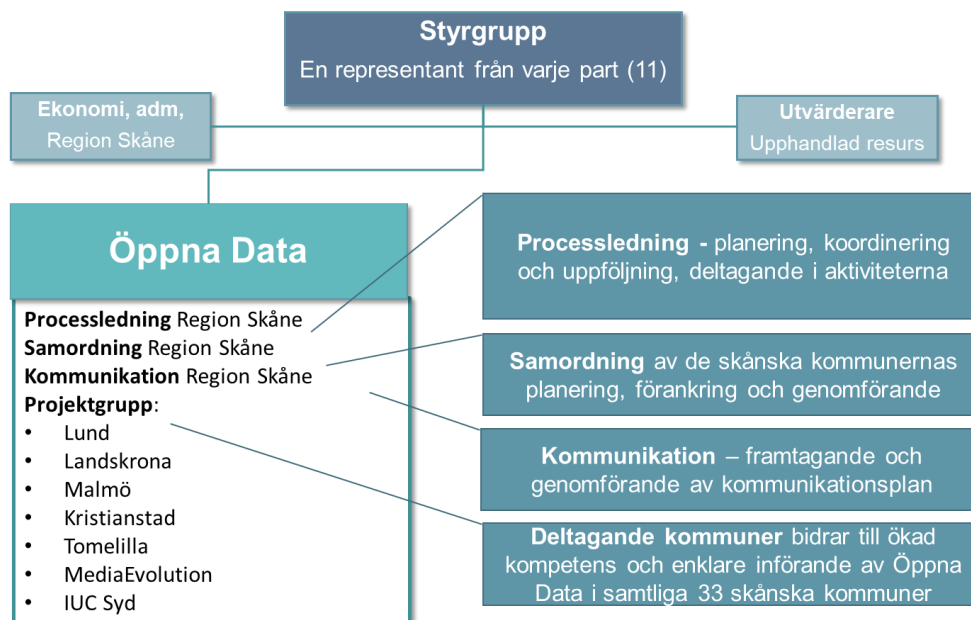

#### 4.3 BEMANNING OCH RESURSHANTERING ÖPPNA DATA

	Organisation	Namn	Kompetenskrav	Omfattning*
S2i2 – delprojekt Öppna Data				
Processledare	Region Skåne, regional utveckling	Jakob Kulas	Senior 13onsult, projektledning	50% av heltid
Processtöd		Filip Dijak	Expert Öppna Data	
Kvalitets- och Leveransansvarig		Fredrik Eriksson	Expert Öppna Data	
Roll	Organisation	Namn	Kompetenskrav	Omfattning*
S2i2 – delprojekt Öppna Data				
Projektdeltagare	Malmö stad	Maria Thernström Emmeli Lind		10% av heltid
Projektdeltagare	Lunds kommun	Andreas Thuröe Truls Helstad		20% av heltid
Projektdeltagare	Landskrona stad	Mikael Mårtensson Jonas Florén		20% av heltid
Projektdeltagare	Kristianstads kommun	Mats Wemmenborn		20% av heltid

**Senast uppdaterad:** 21-10-11

**Projektnamn:** Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering, S2i2,  
Delprojekt Öppna Data

**Projektägare:** Anna Gillquist

**Processledare:** Jakob Kulas

Projektdeltagare	Tomelilla kommun	Hampus Månsson Henrik Lundblad		20% av heltid
Projektdeltagare	IUC Syd	Samir Halimanovic Camilla Dahlin		20% av heltid
Projektdeltagare	Media Evolution	Martin Thörnkvist Petra Nordblad		20% av heltid

\* Med heltid avses deltagande i projektet från och med 2021-06-01 till och med 2022-11-30

## 5 Bilagor

### 5.1 BILAGA 1 – AKTIVITETS- OCH TIDPLAN

Aktivitets- och tidplan är bilagd projektplanen som bilaga 1.

### 5.2 BILAGA 2 – RISKANALYS

En riskanalys är bilagd projektplanen som bilaga 2. Riskanalysen tar utgångspunkt i att projektrisker traditionellt grupperas inom en "projektriangel" där tre faktorer: Tid – Kostnad – Resultat/Kvalité ses som inbördes konkurrerande faktorer.

Ytterligare en utgångspunkt är att identifiera risker utifrån de specifika delmål som finns i Tillväxtverkets (TVV) beslut.

- Risker identifierade inom ram för Tid – Kostnad – Resultat (projektriangeln)
- Risker identifierade utifrån de mål som anges i Tillväxtverkets beslut

Riskanalysen kommer löpande att uppdateras under projektets genomförande.

### 5.3 BILAGA 3 - KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Kommunikationsstrategi är bilagd projektplanen som bilaga 3 och är gemensam för S2i2 (SDK & ÖD).

Kommunikationsstrategin kommer att utvecklas till en kommunikationsplan: där informationskanaler och intressentanalys ingår och då vara specifik för respektive delprojekt: SDK och ÖD.

Kommunikationsplan presenteras till Styrgruppsmöte 2. Kommunikationsplan kommer löpande att uppdateras under projektets genomförande.
